


BŪVNIECĪBAS PROCESA SHĒMA

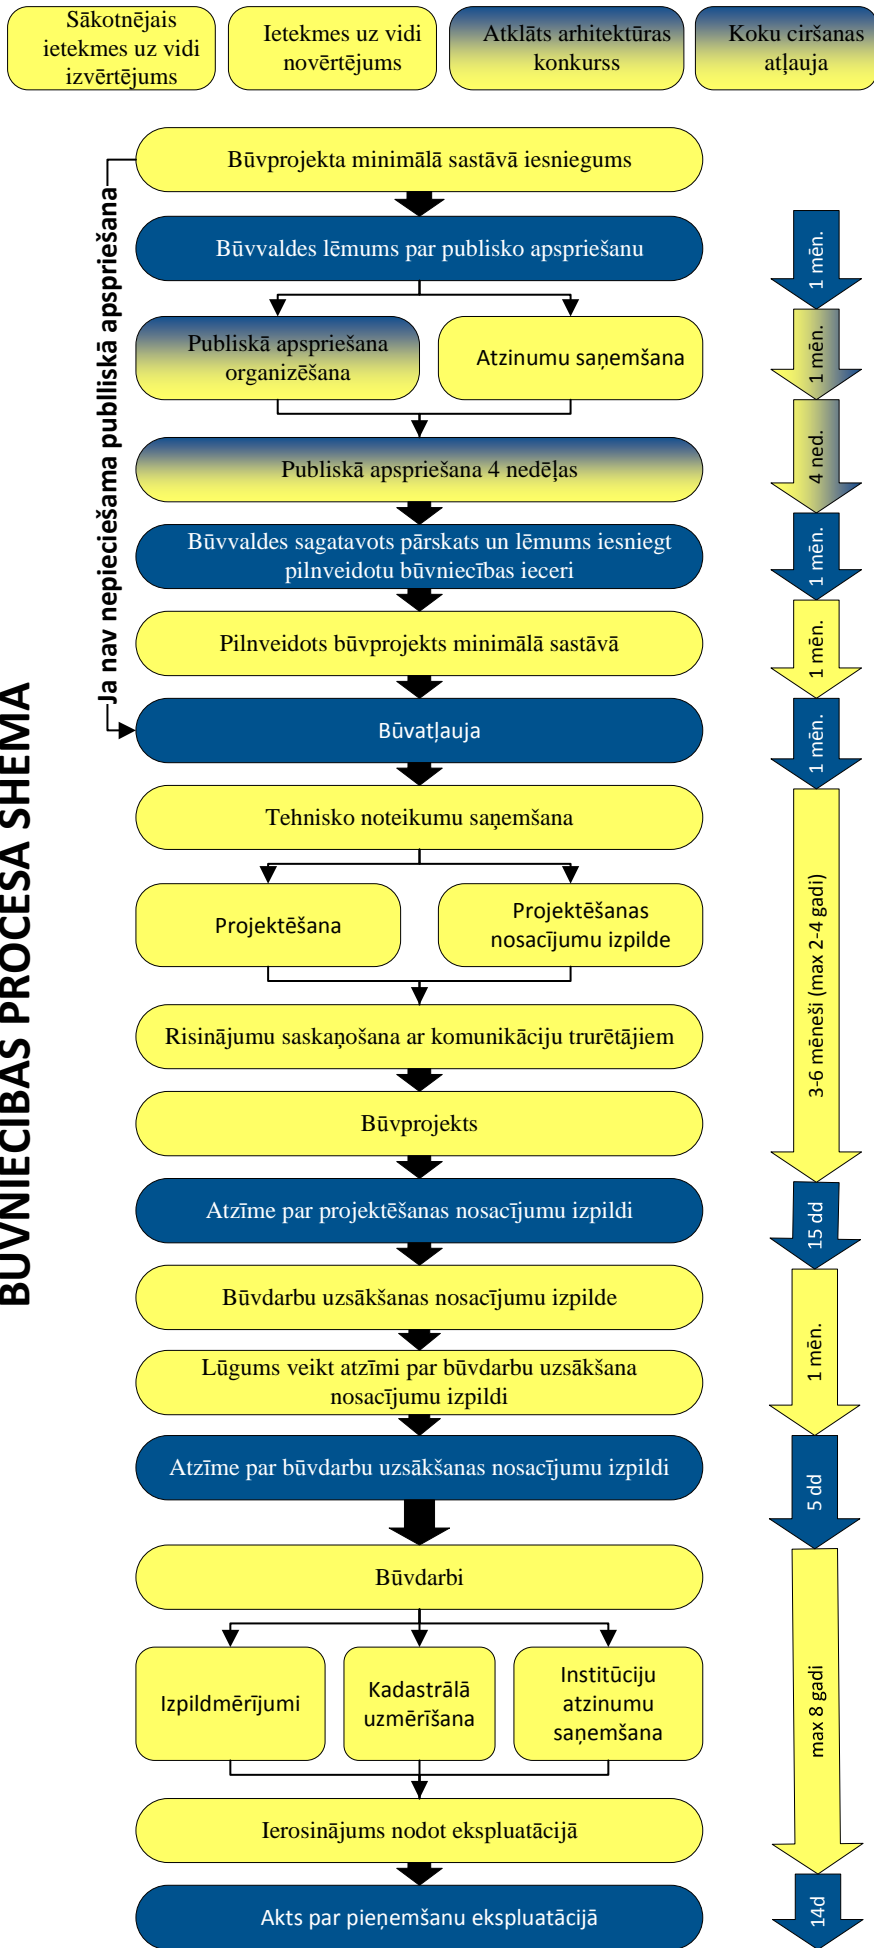

IVSI: 2 mēneši
 IVN: 1 -2 gadi
 Konkurss: 6 mēneši
 Ciršanas atļauja: 10 dd līdz 2 mēneši

Min. 1 mēnesis – max. 2 mēneši tiek organizēta apspriešana un saņemti atzinumi

Būvvalde gatavo pārskatu, 1 mēnesis

Ierosinātais pilnveido ieceri

1 mēnesis

Tehnisko noteikumu saņemšana
 20 dienas + 2 mēneši risinājumu saskaņošana (1 mēnesis no Sadales tīkls un 1mēnesis no RĪgas ūdens)*;

15 darba dienas

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, 1 mēnesis – max. 2 gadi

5 darba dienas

max. 8 gadi (ja IVN – 5 gadi)

14 dienas

* projektēšana un projektēšanas nosacījumu izpilde: 1) tehnisko noteikumu pieprasīšana: Sadales tīkls, Rīgas ūdens, Rīgas siltums, Latvijas Gāze, Rīgas satiksme, Rīgas gaissma, Rīgas domes Satiksmes departaments, Optron, Latvijas Mobilais Telefons, Lattelecom, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Baltcom TV – 20 dienas; 2) projekta saskaņošana: a) Inženieru padome vai b) Sadales tīkls un Rīgas ūdens 1 mēnesis, pārējie – uzreiz; max 2 gadi (otrās grupas būve) vai 4 gadi (trešās grupas būve)

Blue box - Būvvalde
 Green box - Būvvalde un Ierosinātājs
 Yellow box - Ierosinātājs
